// PLANIFICAR
// DESARROLLAR
// PROBAR
// ENTREGAR
// MEJORAR



CARÁTULA DEL PROYECTO

DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL CON SCRUM

GRUPO: system4u

METODOLOGÍA: SCRUM

PROYECTO: Desarrollo de Software

FECHA: 2026


CODIFICAMOS IDEAS, CONSTRUIMOS SOLUCIONES


-SYSTEM4U-

Burndown Chart y Trello

Link:

https://trello.com/b/eEOmsWPg

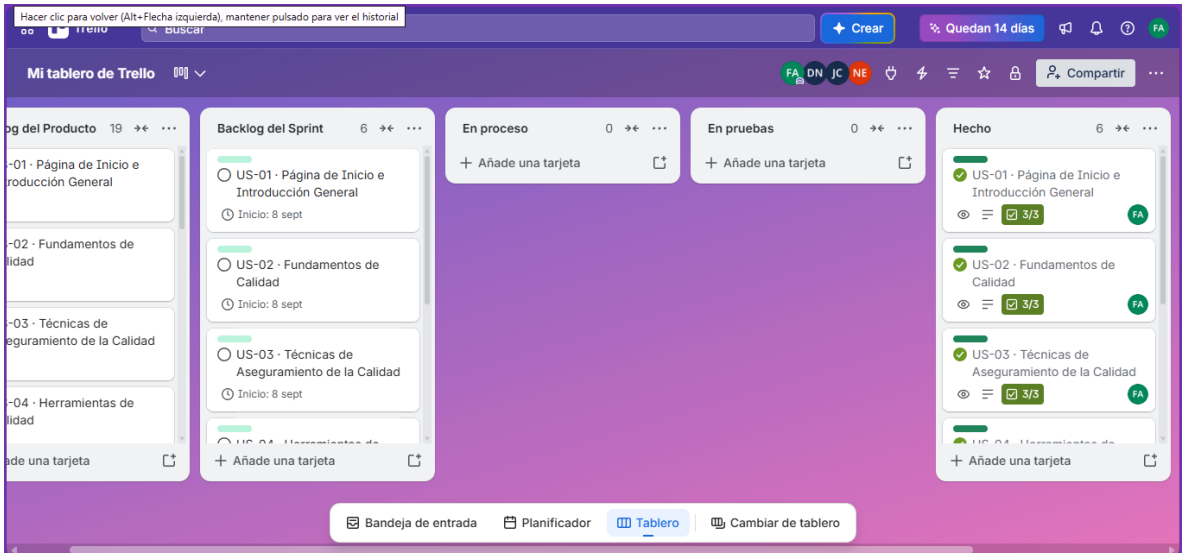

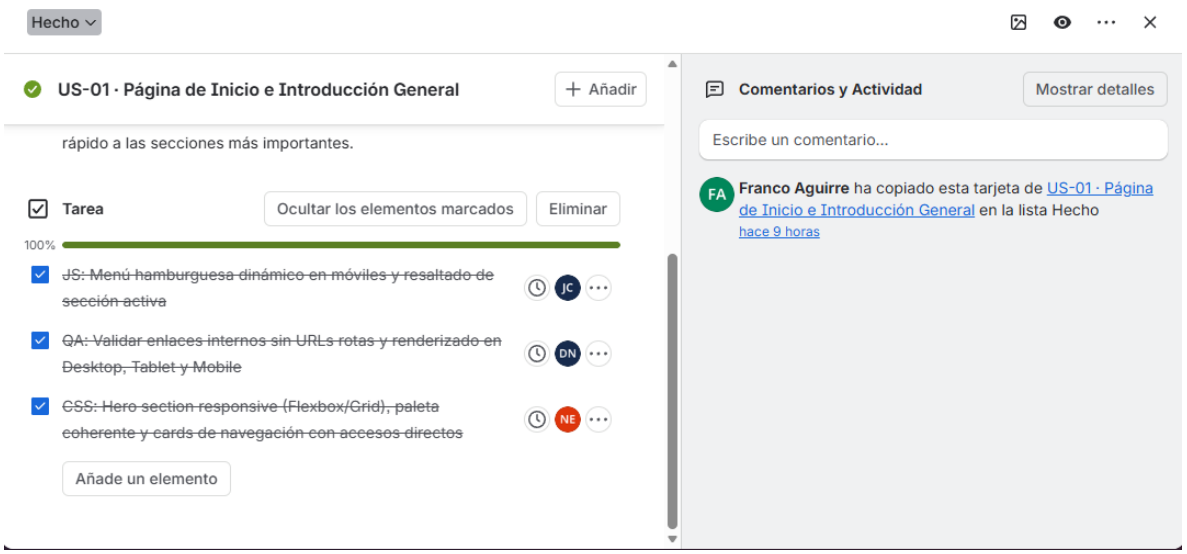

Burndown Chart:



-SYSTEM4U-

Análisis de desviación

1. (07/09 al 15/09). La línea real se quedó en 18 mientras la ideal ya bajaba. En esos días se seleccionaron las historias, se debatió el diseño y se esperó la aprobación del Product Owner. El desarrollo dependía de ese diseño, así que no se cerró ninguna tarea. Al 15/09 la brecha con la línea ideal era de 8 tareas.

2.(16/09 al 21/09). Una vez aprobado el primer diseño, el desarrollador avanzó con la página de inicio, el logo, el banner y el menú. Mientras tanto, el diseñador rehizo las secciones con las correcciones del cliente, y el equipo tuvo que recopilar el contenido de las páginas. La línea bajó de a una o dos tareas por día, por debajo del ritmo ideal de 1,5 tareas diarias.

3. (22/09 y 16/10). Con todos los diseños aprobados el 22/09, se programaron las secciones restantes, se entregó el plan de pruebas y el tester pudo validar. Muchas tareas de CSS, JS y QA se cerraron en pocos días y la línea cayó de 9 a 0. Ese descenso final es tan pronunciado porque el trabajo se acumuló al cierre.
